


一、工程名稱：板橋區音樂公園新建地下停車場統包工程


1. 決標日期：107 年 3 月 2 日
2. 預算金額：6 億 8,115 萬 5,000 元
3. 專案管理顧問：大一聯合建築師事務所
4. 監造單位：喻台生建築師事務所
5. 統包設計施工單位：萬鼎工程服務股份有限公司
6. 開工日期：107 年 8 月 13 日
7. 預計完工日期：107 年 7 月
8. 提供車位：汽車 511 格 (含無障礙停車位 10 輛、親子停車位 10 輛、電動汽車位 5 輛)、機車 100 格 (含無障礙停車位 3 輛、電動機車位 14 輛)




停車場配置圖

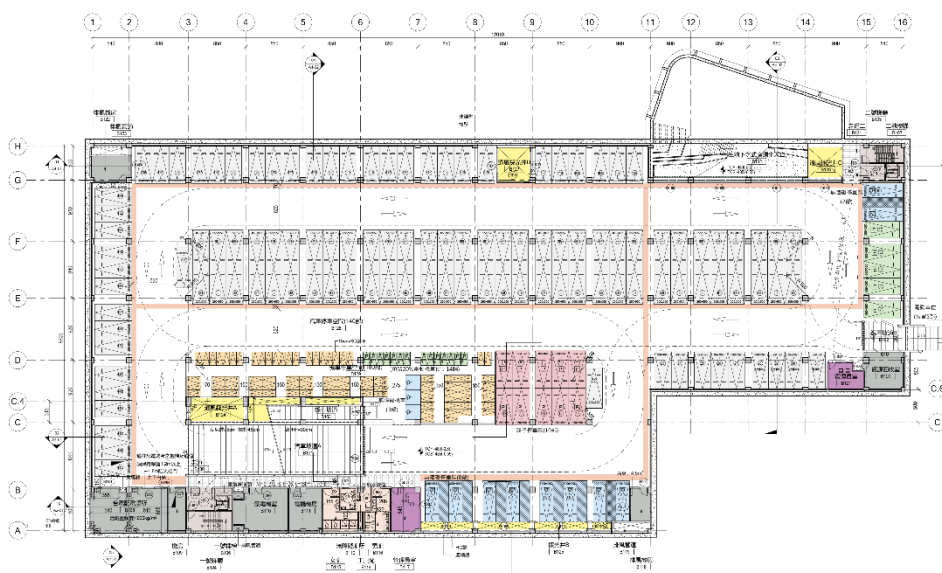

B1 停車場配置圖

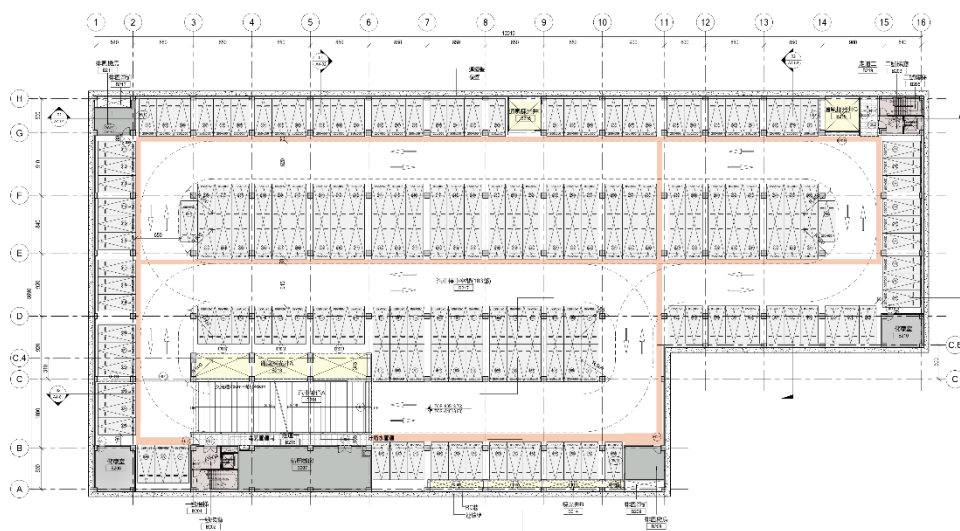

B2 停車場配置圖

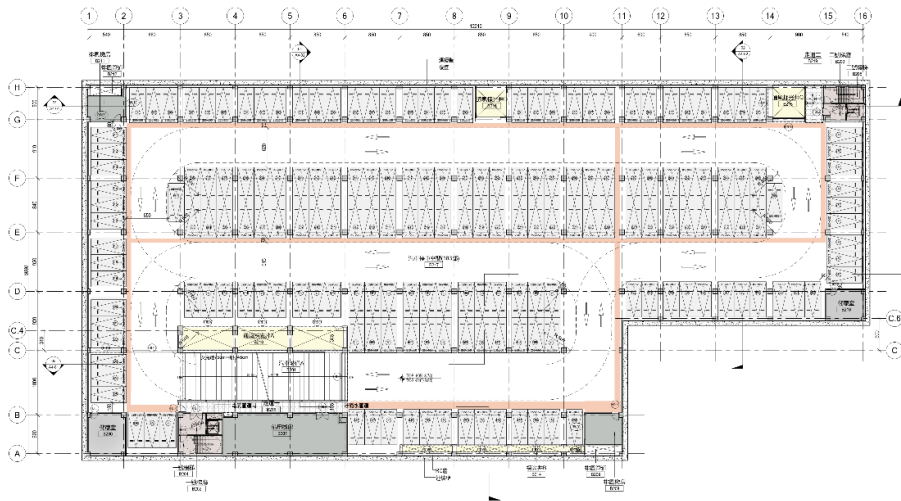

B3 停車場配置圖



公園配置圖

二、工程進度：截至 107 年 9 月底計畫進度 1.51%

1. 都市設計審議通過日期：107 年 8 月 22 日

2. 建照取得日期：107 年 9 月 13 日

3. 施工說明會簡報資料：107 年 8 月 7 日

4. 施工內容：(截至 107 年 10 月 15 日)

(1) 圍籬及安全走廊安裝

(2) 工務所建置

(3) 地上裝置藝術拆遷作業

(4) 樹木移植及修枝作業 (區內移植 59 棵·區外移植 40 棵移到三鶯水資中心、
及鹿角溪公園)

三、施工進度照片 (截至 107 年 10 月 15 日)



照片說明：假設工程(搭設圍籬及安全走廊)



照片說明：假設工程(搭設工務所)



照片說明：9月13日開工動土典禮



照片說明：工區土層夾帶營建廢棄物會勘



照片說明：地上裝置藝術遷移作業



照片說明：地上裝置藝術遷移作業



照片說明：輔仁大學張自健教授移植督導



照片說明：輔仁大學張自健教授移植督導



照片說明：宜蘭大學黃志偉教授移植督導



照片說明：宜蘭大學黃志偉教授移植督導



照片說明：林業試驗所吳副所長移植督導



照片說明：林業試驗所吳副所長移植督導



照片說明：宜蘭大學黃志偉教授移植督導



照片說明：宜蘭大學黃志偉教授移植督導



照片說明：區內移植樹木養護作業



照片說明：區內移植樹木養護作業



照片說明：區內移植作業



照片說明：區內移植作業



照片說明：區內移植作業



照片說明：區內移植作業



照片說明：區外移植作業



照片說明：區外移植作業



照片說明：區外移植作業



照片說明：區外移植作業

預定 107 年 10 月下旬施工項目

1. 樹木移植作業
2. 表土清除掘除作業
3. 洗車台設備安裝作業
